


# 綜合廢物管理設施第一期


(合約編號: EP/SP/66/12)

## 社區聯絡小組第九次會議


2022年12月16日

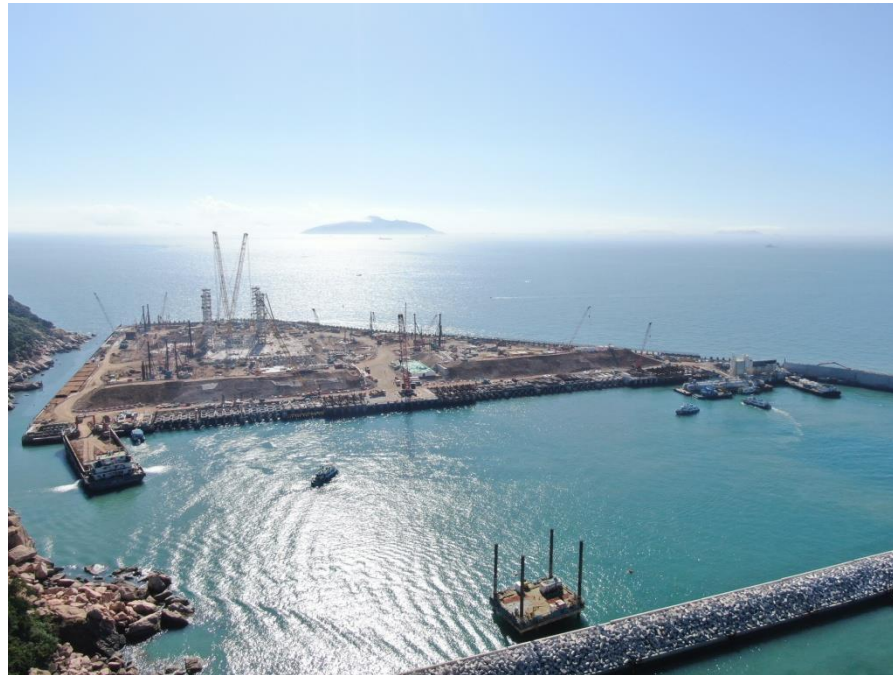

# 會議議程

- 通過社區聯絡小組第八次會議記錄
  - 建議的新任社區聯絡小組成員組成及職權範圍
  - 社區工作進度
  - 社區資訊中心
  - 工程進度
  - 環境監測
  - 未來工作重點
  - 播放項目進度影片
  - 問答環節
- 
- An aerial photograph of a coastal area featuring a large construction site on a peninsula. The site is filled with earth, concrete structures, and construction equipment. The surrounding landscape is lush green with hills and mountains, and the water is a deep blue. The sky is overcast with grey clouds.

# 建議的新任社區聯絡小組成員組成

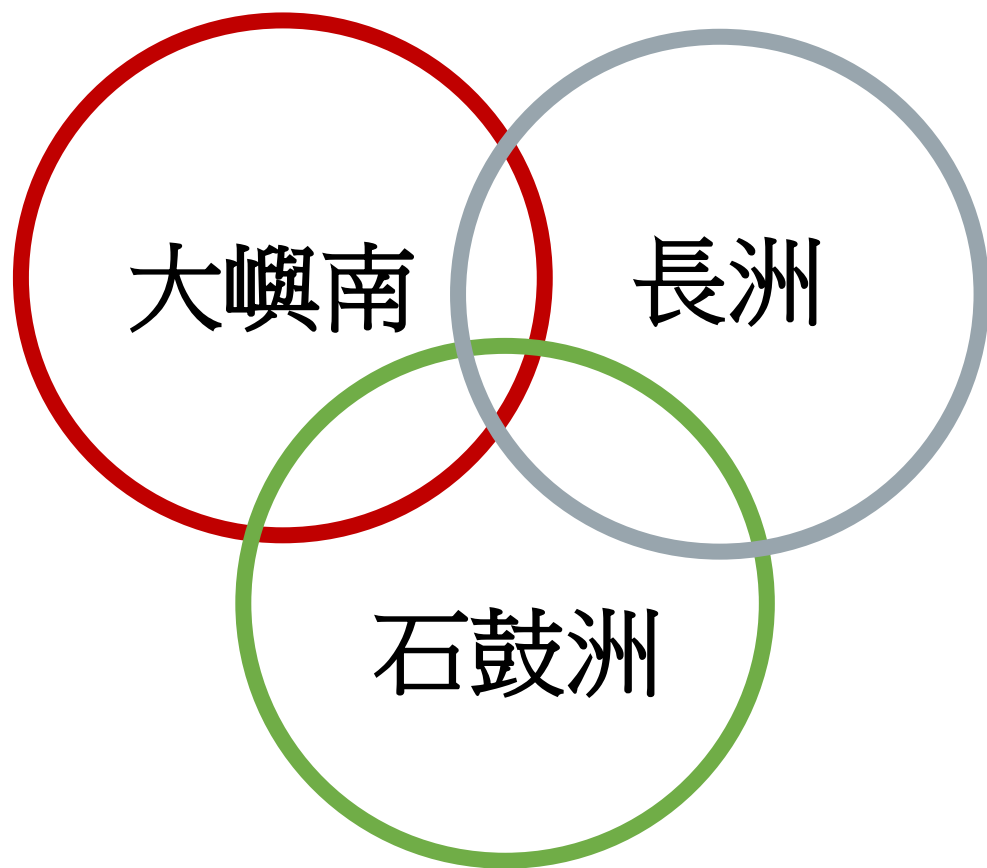

香港戒毒會

石鼓洲康復院

長洲鄉事委員會

大嶼南鄉事委員會

梅窩鄉事委員會

原居民、居民代表

離島區協會

漁民組織代表

長洲地區組織、代表

離島區議會

主席： 環境保護署助理署長或其代表

副主席： 吉寶西格斯 - 振華聯營公司的項目經理

# 社區工作進度



# 造訪地區團體



漁民代表 (2022年9月7日)



香港戒毒會 (2022年9月9日)



長洲鄉委會 (2022年9月7日)



梅窩鄉委會 (2022年9月8日)



大嶼南鄉委會 (2022年9月8日)

# 宣傳I • PARK1 [源 • 島]



**ECO Expo Asia**  
國際環保博覽  
International Trade Fair on Environmental Protection

Green Innovations for Carbon Neutrality  
綠色創科 • 力爭碳中和

14 – 17/12/2022  
Hong Kong Convention and Exhibition Centre • Hong Kong  
香港 • 香港會議展覽中心

14 – 24/12/2022  
Click2Match 商對易  
www.ecoexpoasia.com


Government Convention and Exhibition  
Industry Subsidy Scheme and SME Export  
Marketing Fund – Enhanced Version  
政府會議展覽業資助計劃和中小企業市場推廣基金 – 加強版

Enjoy 50% off the participation fee or up to  
HK\$100,000 / US\$12,820 subsidy for Eco Expo Asia 2022  
參加「國際環保博覽2022」可獲  
高達50%參展費或上限100,000港元 / 12,820美元資助

Please contact us or visit 詳情請聯絡我們或瀏覽：  
<http://ecoexpoasia.com/ex/4>

25週年紀念  
ANNIVERSARY

Organizers 主辦機構: HKTC, messe frankfurt  
Co-organizer 協辦機構: Environment and Ecology Bureau, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 碳中港

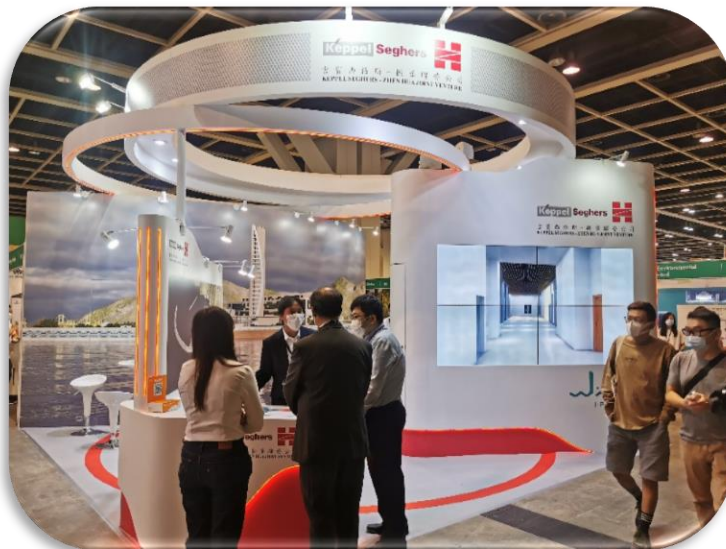

照片拍攝於2021年10月27日



為更有效地將**I•PARK 1**[源•島]這環保設施推廣，吉寶西格斯—振華聯營公司再次參加由香港貿易發展局（香港貿發局）舉辦、香港特別行政區政府環境及生態局協辦的第17屆「國際環保博覽」，日期定於2022年12月14-17日（為期四日）。




社區資訊中心

# I-PARK 1[源 · 島]大嶼南社區資訊中心近況



項目工程

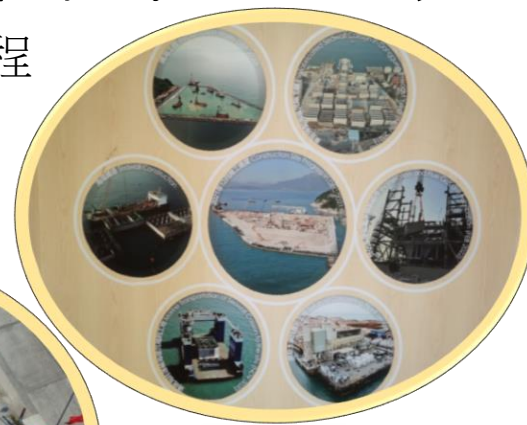

太陽能板安裝



有家長帶同子女到中心教導環保資訊



# I-PARK 1 [源 · 島]長洲社區資訊中心近況

2022年7月28日立法會議員



參觀者/團體



2022年8月15日離島婦聯義工團



2022年9月3日香港工程師學會



2022年9月9日  
新渡輪公司員工

2022年8月20日長洲青年中心





工程進度

# 工程施工回顧

回顧2022年6月至2022年11月，工程項目包括，填海區預壓卸載，地基打樁施工，海堤和碼頭沉箱+3.0mPD 以上結構施工，主焚化爐大樓及煙囪樁帽施工和主焚化爐大樓鋼結構施工。



鍋爐廠房樁帽施工



沉箱加高建造



主焚化爐大樓鋼結構




地基打樁施工

# 預製的焚化設施組件在珠海預製工場的製造進度



鍋爐燃燒機組(2022年10月)

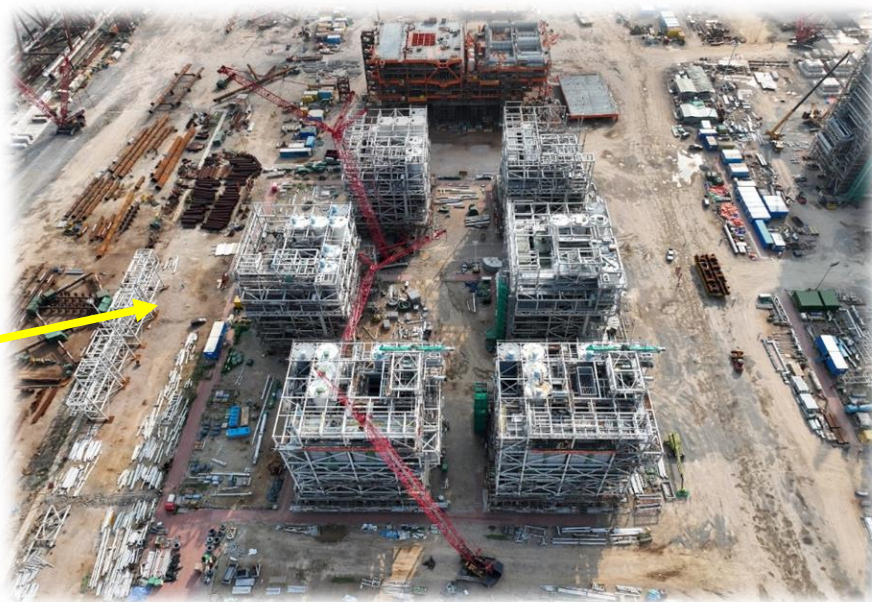

煙氣潔淨機組(2022年10月)



# 預製的焚化設施組件在珠海預製工場的製造進度



鍋爐燃燒機組第1列 (2022年10月)



煙氣潔淨機組第4列(2022年10月)

- 鍋爐燃燒機組及煙氣潔淨機組共12個機組正在製造中

# 預製的焚化設施組件在珠海預製工場的製造進度



管道安裝(一)



管道安裝(二)



鍋爐安裝



爐排安裝



環境監測

# 環境監測

- 建造期間環境監測(2022年5月至2022年11月進行的工作)

監測類別	完成次數
江豚監測	8
水質監測	91
聲音量度	30
白腹海鷗監測	8
珊瑚監測	2

- 根據各項環境監測數據顯示，並沒有因工程而引至異常的情況。
- 環境基線監測報告及每月環境影響監測報告已定期上載在項目官方網站供查閱：

<http://www.iwmfhk.com/tc/index.php>

- 就設置流動空氣質素監測站事宜，環保署會繼續與顧問公司研究有關計劃，亦計畫聘請大學學者為事宜作獨立顧問。



## 2022年5月至2022年11月工程附近水域渾濁度

	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月
(當月控制站平均水平之1.3倍) 控制站 (C1A, C2A)	6.40	6.10	5.80	5.90	6.35	5.40	5.58
下長沙 (B1)	4.40	3.90	4.10	3.90	3.90	3.10	3.13
貝澳 (B2)	4.60	4.00	4.00	4.00	4.00	3.10	3.15
二浪灣 (B3)	4.80	4.50	4.30	4.70	4.90	4.30	4.42
大浪灣 (B4)	5.00	4.40	4.40	4.50	4.90	4.30	4.42
長沙灣魚類養殖區 (F1)	5.10	4.50	4.20	4.80	4.80	4.20	4.32
石鼓洲馬蹄蟹棲息地 (H1)	4.90	4.40	4.30	4.40	4.80	4.10	4.43
長洲東灣 (M1)	4.90	4.60	4.10	4.80	4.60	4.20	4.18

2022年5月至2022年11月工程附近水域平均渾濁度維持在當月控制站平均水平之1.3倍以下，可見水質沒有因工程而引至異常情況



未來工作重點


# 工程重點



- 防波堤沉箱安裝 : 預計明年第一季完成
- 堆載預壓 : 預計明年第一季完成
- 地基樁柱 : 進行中，預計明年第二季完成
- 地基樁帽及基礎建設 : 進行中，第一階段預計今年第四季完成
- 主焚化爐大樓鋼結構現場施工 : 已開始，預計明年第二季完成
- 焚化設施組件現場組裝 : 預計明年年初開始付運

# 施工項目及計劃工期

施工項目	計劃開始工期
填海工程	已完成
地基工程	現正進行中
土木、樓宇及結構工程	2023年第一季度
屋宇設備、機械電氣及裝修工程	2023年第二季
煙囪工程	2023年第二季
固體廢物燃燒過程測試及運作	2025年第二季
運作及維護設施	2025年

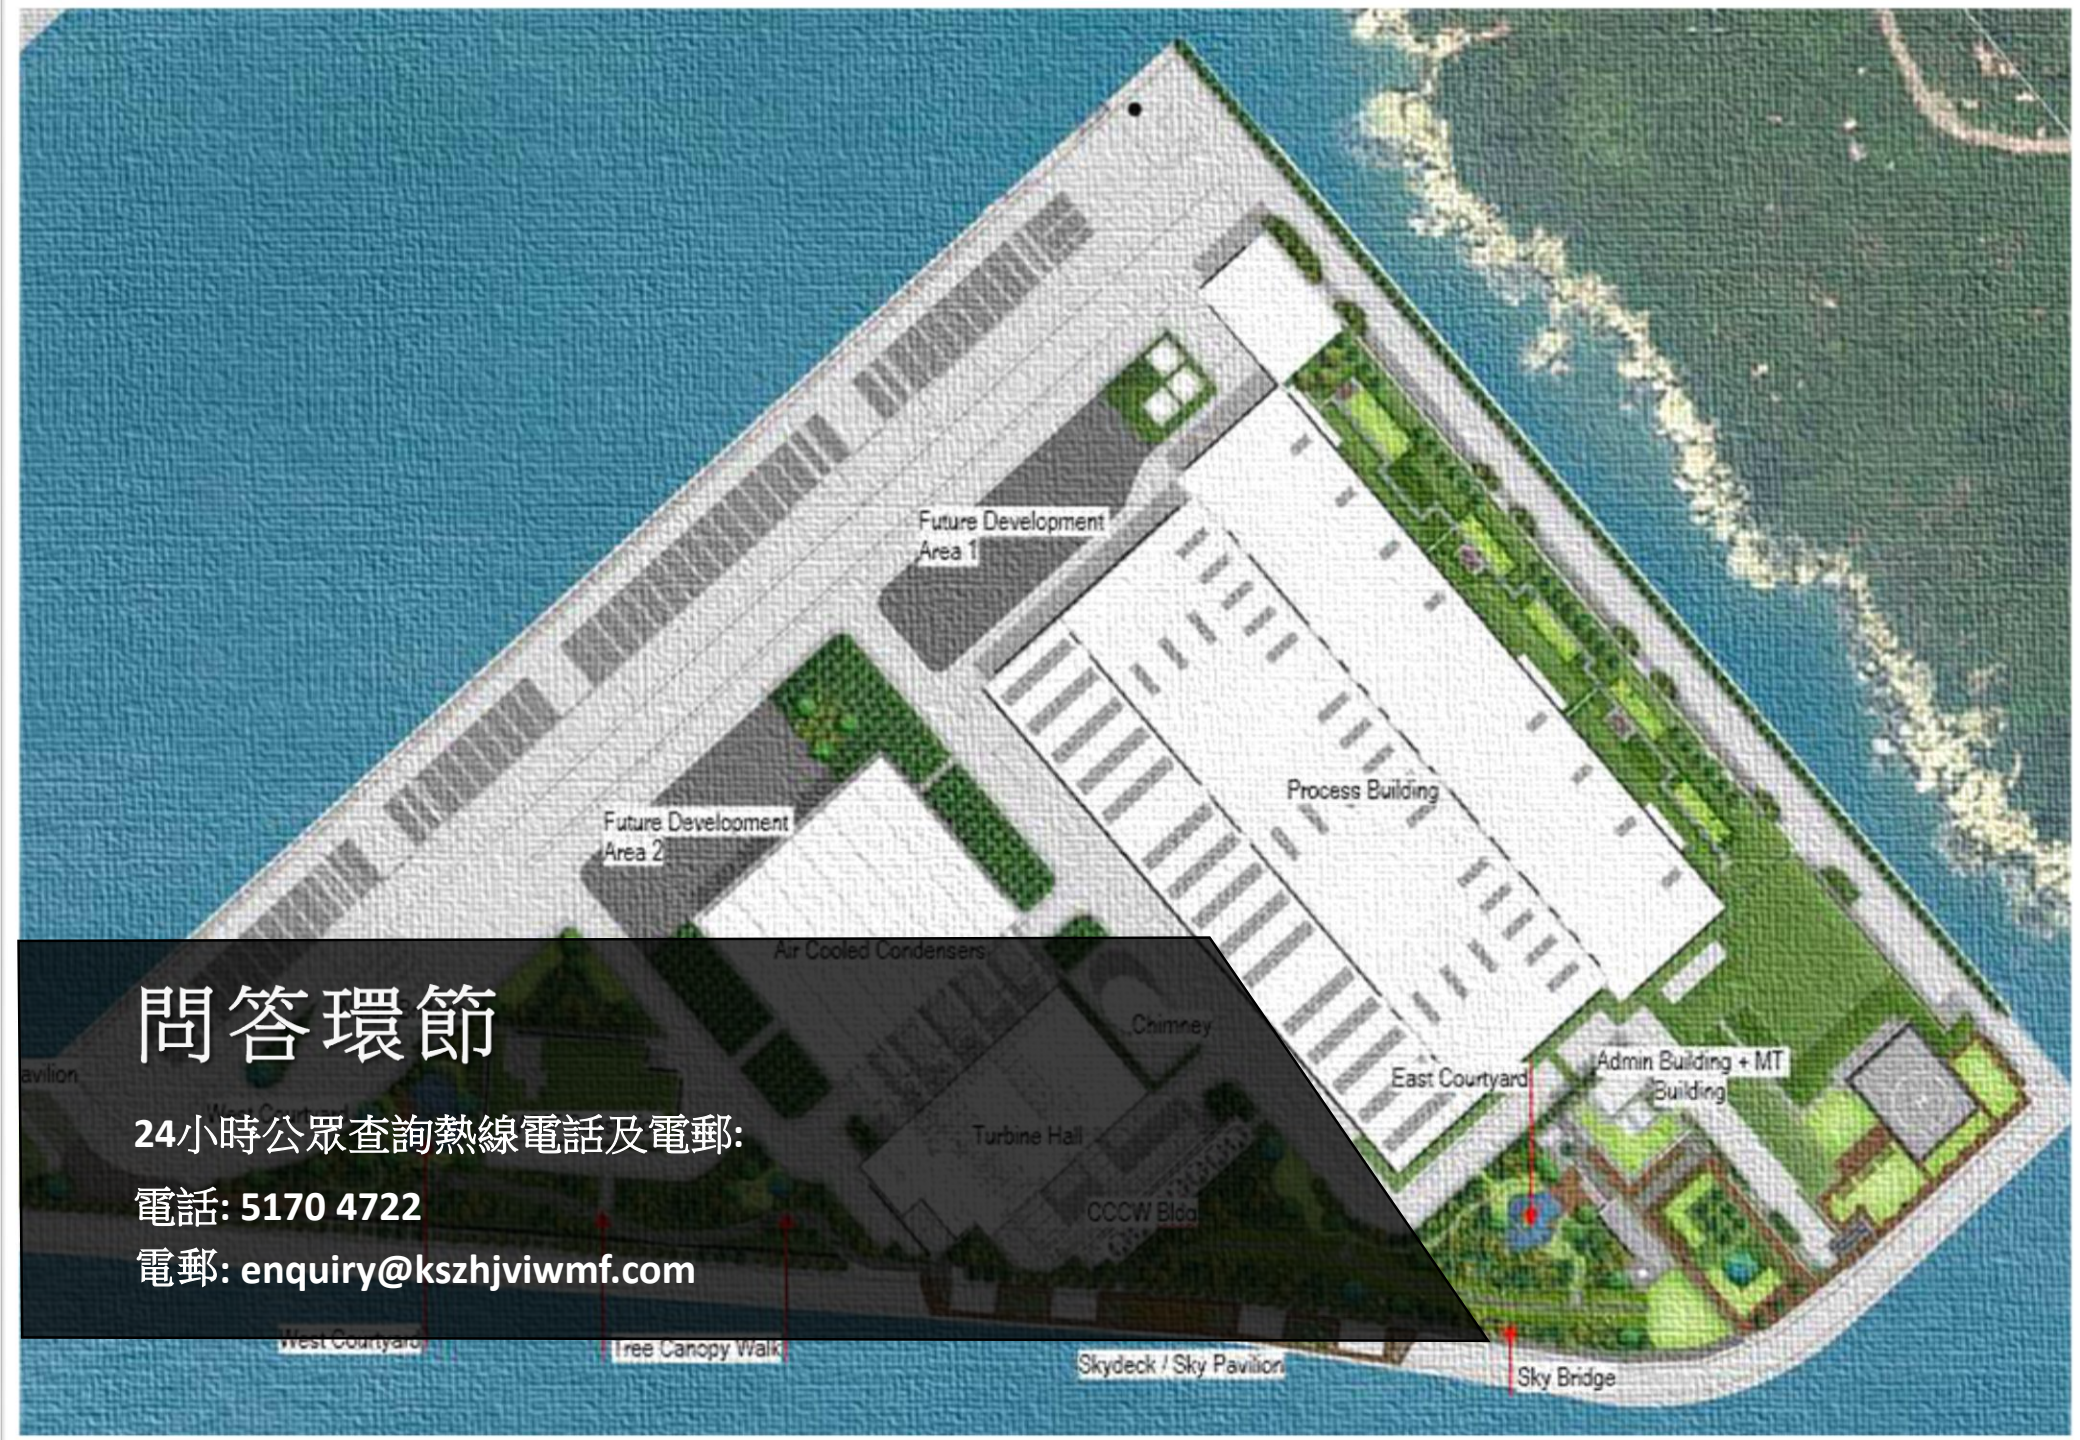

# 問答環節

24小時公眾查詢熱線電話及電郵:

電話: 5170 4722

電郵: [enquiry@kszhjviwmf.com](mailto:enquiry@kszhjviwmf.com)
